



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	PREFABRIK TAKSİ DURAĞI MONTAJLI		2	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 1.12.2025 14:30:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü



2 ADET TAKSİ DURAĞI(MONTAJLI)MAL ALIM İŞİ

A. İşin Konusu:

1-Şanlıurfa ili ,Eyyübiye İlçesi , Divanyolu yayalaştırma işi kapsamında ,yayalaştırma alanı içerisinde bulunan taksi duraklarının yeni modern duraklar ile değiştirilmesi amacı ile montajlı taksi durağı mal alım işi

B. Yapıya ait Teknik özellikler:

Yapısal Özellikler

- Ebatlar :300 Cm x 300 Cm
- Standartlar : Çelik Malzeme = St 37 / Betopan = TSE 634 – 2 / Cam Yünü = TS 901 / Polistren Köpük TS 7316
- Kar Yüğü &Rüzgar Hızı : 80 kg / m² – 102 km/saat
- Şase Yüğü Kapasitesi: 200 kg/m²
- Dış Duvar İletim Katsayısı: K: 0.40 Kcal/m²hC
- Çatı İletim Katsayısı: K: 0.35 Kcal/m²hC
- Taban Isı İletim Katsayısı: K: 0.68 Kcal/m²hC
- Şase Yüğü Kapasitesi: 200 kg/m²
- Taksi durağı Kabin Dış Yüzey Kaplama 12 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha kullanılmalıdır.
- Taksi durağı Kabin Dış Duvar İzolasyonu 40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılmalıdır.
- Taksi durağı Kabin Dış Duvar İç Kaplama Dış yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılmalıdır.
- Lüks Kabin Dış Yüzey Kaplama 12 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Ahşap Desenli Betopan) kullanılmalıdır.
- Lüks Kabin Dış Duvar İzolasyonu 40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılmalıdır.
- Lüks Kabin Dış Duvar İç Kaplama 8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Betopan) kullanılmalıdır.
- İç Duvar İç Yüzey İç yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında olmalıdır.
- COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılmalıdır.
- İç Duvar İzolasyonu 40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılmalıdır.

pd



- Yapının Tabanı Konstrüksiyon 2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak kontrüksiyon oluşturulmalıdır.
- Yapının Tabanı Zemin Kaplama 16 mm Kalınlığında betopan levhalar üzerine pvcmineflo döşenmelidir.
- Yapının Çatı Konstrüksiyon 2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak kontrüksiyon oluşturulmalıdır.
- Yapının Çatı Kaplama 0.50mm Kalınlığında 27mm*200mm hadve derinlikli natural galvaniz sac kullanılmalıdır.
- Yapının Çatı İzolasyon 80mm kalınlığında 14kg/m3 yoğunluğunda şilte cam yünü kullanılmalıdır.
- Yapının İç Yüzey 10mm Beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılmalıdır.
- Dış Kapı 90 * 195 ebatlarında İzoleli Sac Kapı olmalıdır.
- 0.50 mm Kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilmelidir.
- Pencere 95 / 100 Ölçülerinde Alüminyum Pencere olmalıdır.
- Pencere Karkası 0.60 mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz trapez sac kullanılmalıdır.
- Çift Cam 4+12+4 mm kalınlığında kullanılmalıdır.
- Durakların yerleşeceği zemin eğimli olduğundan mevcut zemin teraziye getirilerek 2 adet durağın yerleşimin üniform olması sağlanacaktır. Durak zemini durak ölçü ebatlarında hazır plak 10 cm konulacak(eğime göre tasarlanacak) veya yerinde döküm ile yüzeyin eğim farkı kapatılacaktır. Yapılacak zemin imalatının açıkta kalan yan yüzeyleri taksi durağında kullanılan dış kaplama malzeme ile kapatılarak tek tip görünüm olması sağlanacaktır.

Elektriksel Özellikler

• Sigorta Kutusu

Taksi durağı kulübesine 1 adet en az 18'li Halojensiz Alev Geciktirici Tipte ve Sıva Altısigorta kutusu olacaktır.

Sigorta Kutuları IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 standartlarına sahip olacaktır.

Kullanılacak Şalt Malzemeleri

Anahtarlı Otomatik Sigortalar(AOS)

Projesinde gösterilen adet ve özelliklerde AOS'lar yeni tesis edilecek Taksi durağı kulübesine 8'lisigorta kutusunda kullanılacaktır.

Kullanılacak AOS'lar; aydınlatma ve prizdevrelerinde B ve C kategorili ve proje değerine (Yükleme Cetveli) uygun akımlı ve TSE ve CE belgeli malzeme olacaktır.

(Handwritten signature)



Kaçak Akım Koruma Rölesi: (KAKR)

Projesinde gösterilen adet ve özellikteki KAKR yeni tesis edilecek Taksi durağı kulübesi sigorta kutusunda kullanılacaktır.

Mevcut pano ve sigorta kutusuna ait elektrik tesisatı linyelerinde; elektrik kaçağı arızası olduğunda, fazlar ile nötr hattı üzerinde oluşan "HATA Akımını" hissederek 10 – 30 saniye içinde koruma devresini keserek can güvenliğini sağlayacak olan Kaçak Akım Koruma Röleleri; uygun akımlı ve 30 mA'lık malzeme olacaktır.

"Kaçak Akım Koruma Röleleri"nin çalışıp çalışmadığının kontrolü için; Rölelerin kendi üzerinde "LOKAL TEST" butonu olacaktır.

Kaçak akım koruma röle ve şalterleri TS EN 61008-1, TS EN 61008-2.1 standartlarına uygun ve akım-zaman ayarlı olacaktır.

Kablolar

Taksi durağı kulübesi için projesinde ve birim fiyat tariflerinde gösterilen tipte ve kesitte kablolar, aydınlatma, priz ve klima tesisatında kullanılacaktır.

Proje kapsamında kullanılan kablolar; NYY, N2XH, NHXMH tipli olup TSE ve CE belgeli olacaktır.

Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacak, aksi belirtilmedikçe alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır.

Sahada enerji temini için kullanılacak kabloların döşenme şekli için projedeki detaylar uygulanacaktır.

Tüm kuvvetli akım kabloları IEC60502-TS9759 HD214.S2-VDE276-TS9758 HD213.S3 standartlarına uygun olacaktır.

Prefabrik yapıya ait (Taksi durağı kulübesinde 1 adet) 1 noktada klima beslemeleri ayrı çekilerek bağımsız sigortalarda sonlandırılacaktır.

Aydınlatma, Priz ve Klima alt yapı Elektrik Tesisatı

Aydınlatma ve priz tesisatı projesinde gösterildiği şekilde Aydınlatma ve Priz tesisatı linyelerinde 2,5 mm², sortilerinde ise 1,5 mm² olmak üzere NHXMH tipi kablolar ile yapılacaktır.

Klima beslemesi ayrı linyeler ve sigortalardan 3x2,5 mm² NHXMH kablo ile yapılacaktır.

Taksi durağı kulübesinin projesinde gösterilen tüm elektrik tesisatı alçıpan levhalar arkasına tesis edilecek PE HFFR borularla sıva altı şekilde yapılacaktır.

İmalat süresince lüzumlu tedbir önceden alınacak, döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanalları yüklenici açacaktır.

Tesisatta yanmaz plastik klemens kullanılacaktır. Eriyen ve yanan cins klemens kesin olarak kullanılmayacaktır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü



Anahtar ve Prizler

Taksi durağı prizler, başkaca belirtilmediği takdirde 250 V, 16 A, tekli, 2 kutuplu, 3 telli ve genel amaçlı topraklı tipte olacaktır. Prizlere kablo bağlantıları vida ile yandan ya da arkadan yapılacaktır. Priz gövdesi darbe ve ısıya dayanıklı olacaktır.

Tüm hacimlerde sıva altı tesisat olan mahallerde zayıf akım prizlerini de kapsayacak şekilde grup çerçeve öngörülmektedir. Prizler dekoratif tip ve en iyi kalitede olacaktır.

Anahtarlar, 10 Amper, 250 Volt anma değerinde ve kablo terminalleri vidalı tür olacaktır. Aksi belirtilmedikçe, tüm duvarlardaki anahtarlar ışıklı gömme tip yapılacaktır. Anahtar, üstten basıldığında lambalar yanacak, alt kısmına basıldığında lambalar sönecek şekilde monte edilecektir. Anahtar gövdesi darbe ve ısıya dayanıklı olacaktır.

Tüm anahtarlar dekoratif tip ve en iyi kalitede olacaktır. Anahtarlar; biçim, model ve renk bakımlarından prizlere uygun olacaktır.

Aydınlatma Armatürleri

Projesinde ve birim fiyat tanımlarında belirtilen LED armatürler iş kapsamında kullanılacaktır.

Taksi durağı kulübesi iç ortamında kullanılacak;

LED tavan armatürü: gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az **IP 40** koruma derecesine, sıva altı, min. **60x60** ebatlarında ışık akısı **en az 3300 lm**, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olacaktır.

Topraklama Sistemi

Taksi durağı kulübesi yeni binasının temel topraklaması projesine uygun şekilde yapılacaktır.

Prefabrik yapının çelik konstrüksiyon profillerden oluşan iskeleti projede gösterildiği şekilde temel topraklamasına irtibatlandırılacaktır.

Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.

Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarına ve en son yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.




T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü



C- Diğer Hususlar

- **Ekteki görsele uygun şekilde Taksi durağı kulübesi ait renk idare tarafından belirlenecektir.**
- Birebir ekteki görsele uygun şekilde imalat yapılması gerekmektedir.
- 2 adet Taksi durağı Kulübesi İdarenin belirleyeceği alan içerisinde Tüm alt yapıları yapılarak montaj sağlanacaktır.
- Yüklenici taksi duraklarının montajı esnasında mevcut döşemeye zarar vermeyecektir.
- Yüklenici montajla ilgili her türlü nakliye aracı,vinç vb. ekipmanların tedarikini kendisi sağlayacaktır.
- Yüklenici Montaj esnasında her türlü trafik ve güvenlik tedbirini alacaktır. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan idare sorumlu değildir.
- 2 Adet Taksi durağı (montajlı) mal alım işinin süresi **30gündür**.İşin süresinde bitirilmemesi durumunda günlük 500 TL Para Cezası uygulanacaktır.para cezası faturadan düşülecektir.

TEMSİLİ UYGULAMA GÖRSELİ

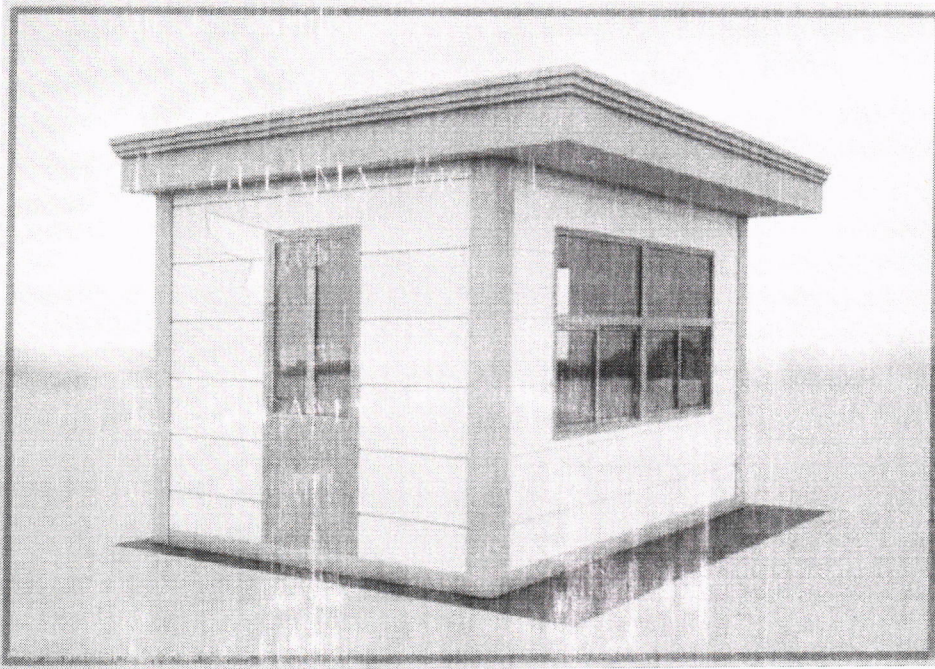




T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü



YAPIYA AİT KAT PLANI

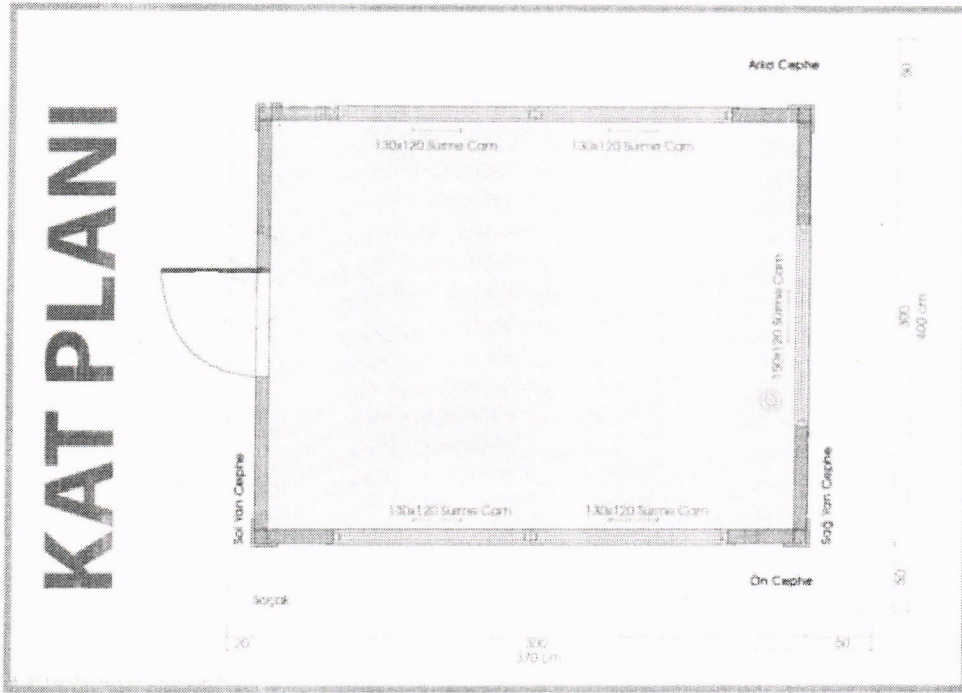

Mehmet Haluk DUYĞUN
Toplu Taşıma Şube Müdürü

PREFABRIK TAKSI DURAĞI MONTAJLI MAL ALIM İŞİNE AİT

İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 01.12.2025 saat: 14:30**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **8 (SEKİZ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

İLETİŞİM :MEHMET HALUK DUYĞUN – 0553 066 8888
